

EEN BLOK STAD ROTTERDAM SPOORPUNT


Wijzigingen Tijdens de Bouw. 17-07-2017

De verkoopstukken zijn met uiterste zorg samengesteld. Desondanks hebben wij onvolkomenheden hierin ontdekt. Deze worden door dit formulier "wijzigingen tijdens de bouw" gecorrigeerd. In het verleden zijn er al twee errata verstuurd. Na het tekenen van de Koop- en Renovatie Overeenkomst veranderd officieel de naam van het Erratum in Wijzigingen Tijdens de Bouw. Dit formulier bestaat uit een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de verkoopstukken.


Verkooptekeningen

Bouwnummer 2,4,6,8,

Op de verkooptekeningen zijn de ramen van de kopgevel niet juist getekend. De afmeting van de ramen en het penant ertussen klopt niet. Op de verkooptekening is te zien dat het penant tussen de ramen een afmeting heeft van 2000 mm en de ramen zelf zijn 790 mm breed. In werkelijkheid is het penant kleiner (1140 mm) en zijn de ramen groter (1220 mm). Zie hiervoor ook de bijlage Rectificatie kozijnen kopgevel dd.12-07-17.

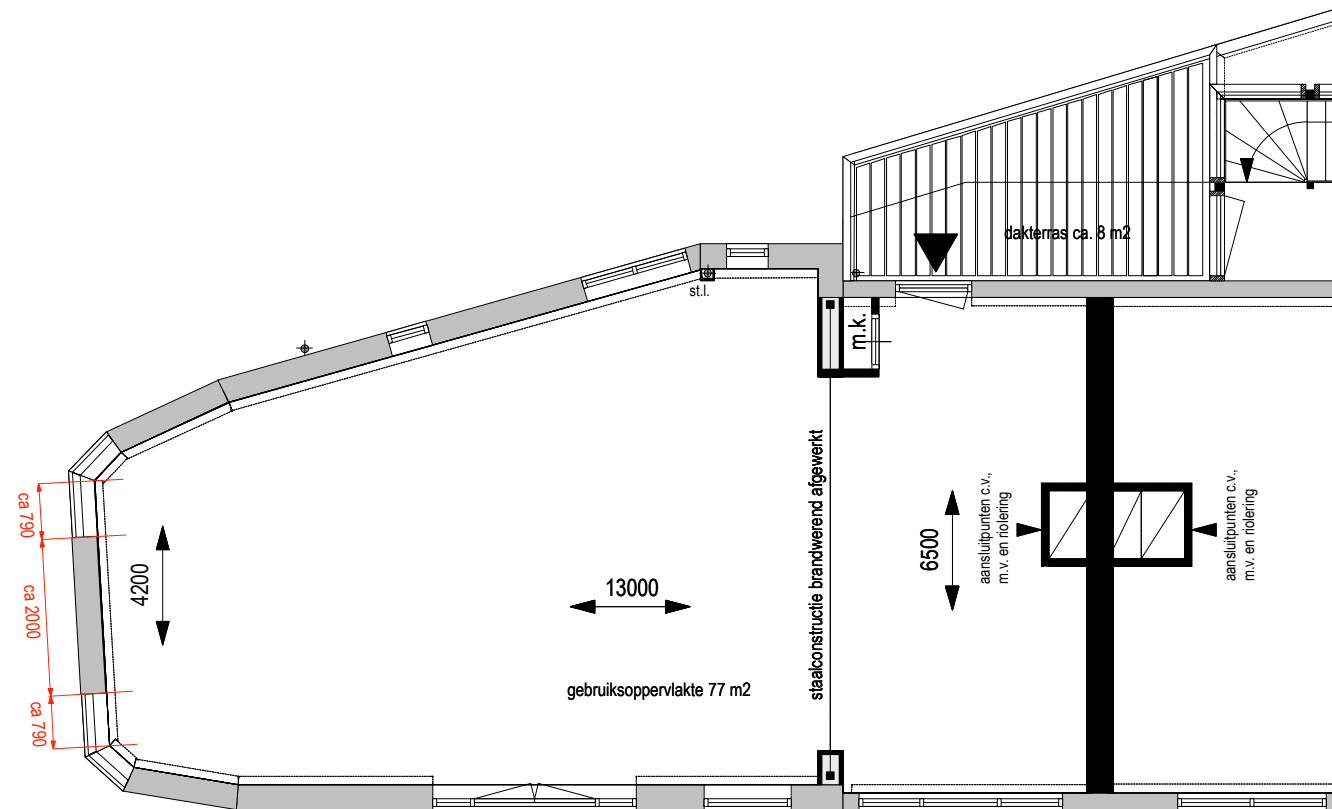

eerder aangenomen maatvoering kozijnen kopgevel

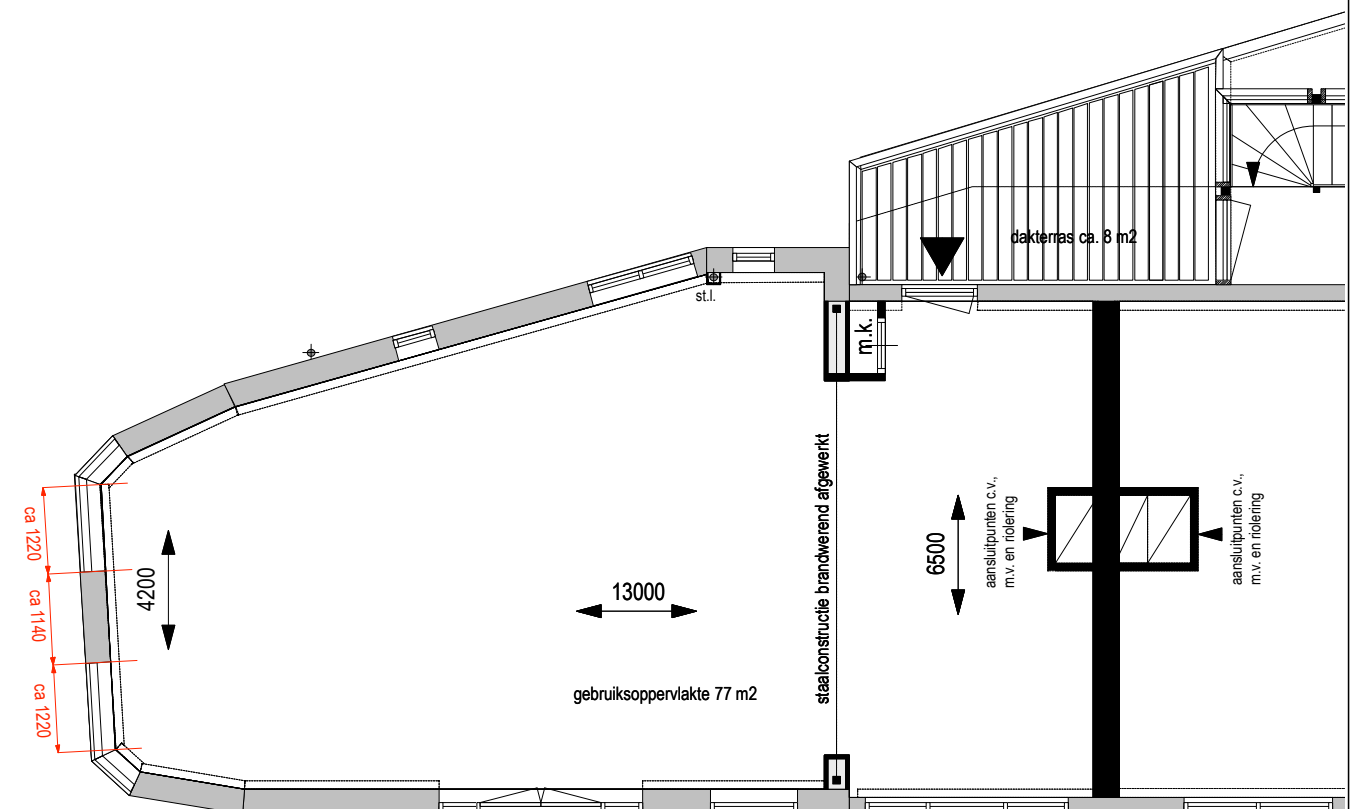

gemeten maatvoering kozijnen kopgevel
